

## Schéma de conception via BDRando d'un topo-guide PR ou GR® [réédition]

 Fédération (chargé d'édition)

 Comité (contact édition / coordinateur)

M -6

Comité : évaluation du volume de mises à jour (ajouts / remplacements / suppressions / modifications) pour avoir une vision globale du projet

Fédération (si nouveaux itinéraires) :

- conception du chemin de fer
- projet de convention d'édition



M -5



Comité :

- mise à jour des itinéraires dans le WebSIG
- mise à jour des PGD, des POI et des POV dans Publiweb

Si nouveaux itinéraires :

- saisie des itinéraires dans le WebSIG
- création des PGD dans Publiweb (uniquement sélection des tronçons et placement de repères, pour avoir l'ossature des circuits) ; attention au nommage !

### ⚠ Prérequis et préalables :

- date de rupture confirmée
  - feu vert financier
  - tous les acteurs concernés prêts
- Pour topo-guides GR® et GR® de Pays :*
- toute modification ou création d'itinéraire doit transiter par la CRSI
  - prise en compte de la redynamisation du réseau



Préparation des éléments selon charte éditoriale

Sur fichier Word :

- liste des hébergements si topo-guide GR®
- mise à jour des infos pratiques
- mise à jour des articles thématiques si nécessaire

Si nouveaux itinéraires :

- rédaction des descriptifs avec repères chiffrés
- rédaction des articles thématiques

Dans un dossier :

- iconographie (dont la photo de couverture)
- logos et pages de communication



M -4 Corrections et validation des éléments

Fédération :

- relecture et vérification des PGD modifiés
- Si nouveaux PR, relecture et vérification des textes envoyés :
- descriptifs et cartes
  - articles thématiques
- mise à jour de la couverture : sélection de la photo et actualisation des plans de situation

Comité :

- réception des demandes de précisions sur les tracés, les descriptifs voire les articles thématiques
- envoi des réponses



M -3

Mise à jour et saisie des données dans Publiweb

Comité :

- finalisation des PGD suite aux derniers échanges

Si nouveaux PR :

- saisie des descriptifs validés
- saisie des thématiques corrigés (si droits ok)
- saisie des photos sélectionnées (si droits ok)



Fédération : validation des PGD



Mise à jour et saisie  
des données dans Publiweb

PubliWeb

Comité :

- mise à jour et/ou création des bandeaux étapes
- mise à jour et/ou création et paramétrage des POR
- mise à jour des infos pratiques

Si nouveaux PR :

- consommation des PGD et des thématiques
- pagination
- consommation des médias (photos et dessins) dans les thématiques et les descriptifs
- pose des emprises carto + pagination

M -2

Finalisation de la maquette

Fédération :

- « export PAO » : mise en page semi-automatique de la maquette à partir de Publiweb
- mise en page définitive
- réalisation des cartes

Comité :

- réception d'épreuves pour relecture
- envoi de corrections à la Fédération

Fédération :

- intégration des corrections dans la maquette


PubliWeb

Comité :

- intégration des corrections dans Publiweb
- réception des épreuves définitives pour bon à tirer (BAT)
- envoi du BAT à la Fédération

M -1

Fédération : envoi en fabrication

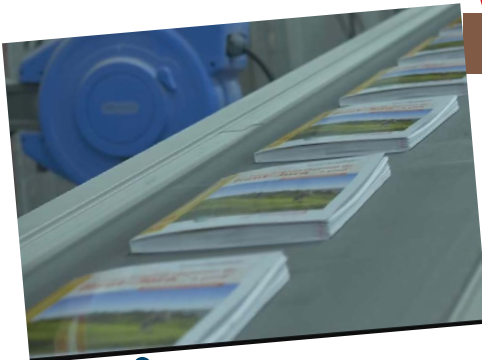

M

Livraison  
Mise en vente



Pour plus de détails : charte éditoriale fédérale

Pour toute question : > chargées d'édition FFRandonnée  
> aide en ligne et FAQ Publiweb  
> vos formateurs Publiweb
